

中学校全員給食について

総合教育部 おいしい給食課

1. 政策等の背景・目的及び効果

中学校全員給食の実施に向けて、既設の第一学校給食共同調理場の中学校給食エリアの改修に加え、新たな給食センターをPFI方式で整備するため、現在、新たな給食センターの整備についてはアドバイザー委託を実施し、PFI事業者の公募・選定に向け準備を進めているところです。

つきましては、新たな給食センターにおける「（仮称）枚方市立中学校給食センター整備運営事業」の事業概要及び事業者の公募選定までの流れと中学校全員給食開始までの事業スケジュールの案について報告するものです。

2. 内容

(1) 「(仮称)枚方市立中学校給食センター整備運営事業」の事業概要について

●別紙参考資料1のとおり

(2) PFI事業者の公募選定までの流れについて

令和6年(2024年)7月	第1回事業者選定審査会
8月	実施方針・要求水準書(案)公表 実施方針・要求水準書(案)への質問・意見〆切
9月	実施方針・要求水準書(案)への質問・意見回答公表
10月	第2回事業者選定審査会
11月	教育子育て委員協議会 特定事業の選定等報告
12月	特定事業の選定・公表・入札公告
令和7年(2025年)1月	入札説明書等に関する第1回質問の〆切
2月	入札説明書等に関する第1回質問回答公表 参加表明書提出〆切
3月	参加資格審査結果通知 入札説明書等に関する第2回質問の〆切
4月	入札説明書等に関する第2回質問回答公表
5月	提案書類の受付及び入札
6月	第3回事業者選定審査会

- 7月 第4回事業者選定審査会
落札者決定及び公表
- 9月 定例月議会へ契約締結議案提出

(3) 中学校全員給食開始までの事業スケジュール（案）について

●別紙参考資料2

- ・令和5年(2023年)11月（教育子育て委員協議会）以降の変更点

①第一学校給食共同調理場の改修期間に、民間給食事業者を活用した給食提供の可否について最終判断のリミットを令和6年(2024年)6月末としており、引き続き民間動向を調査しましたが民間給食事業者の状況には変わりはなく、外部発注による給食の調達は不可能という結果。

②（仮称）枚方市立中学校給食センターの整備については、現在の世界的な原材料の品薄・高騰の影響により、かつて経験のない価格高騰・納期遅れが発生している社会情勢等も考慮しますと、設計・建設期間が21カ月を4カ月延長し、25カ月。

以上のことから中学校全員給食の開始は令和10年(2028年)2学期とします。

3. 実施時期等

令和6年（2024年）10月 第2回枚方市立中学校全員給食事業PFI事業者選定審査会
11月 教育子育て委員協議会 特定事業の選定等報告

4. 総合計画等における根拠・位置付け

総合計画

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち



5. 関係法令・条例等

学校給食法

6. 資料

- ・参考資料 1 事業概要
- ・参考資料 2 事業スケジュール(案)

(仮称)枚方市立中学校給食センター整備運営事業 事業概要

1. 事業概要

1.1. 内容

本市では、市立中学校への給食提供方法をランチボックス方式の選択制から食缶方式の全員給食制に移行するにあたり、「今後の中学校給食に関する方針」(令和4年12月策定)を策定し、既設の第一学校給食共同調理場に加え、新たに本施設を整備することとしている。本施設の建設地は第三学校給食共同調理場跡地であり、本事業において現存する旧施設を解体し、本施設を新設するものである。


本事業は、旧施設の解体から本施設の設計、建設、維持管理、運営を民間事業者が一貫して実施するPFI方式を導入することにより、民間の高度な技術力や経営能力等のノウハウ及び資金を活用し、市が行う献立作成や食材調達と連携することで、市立中学校へ安全でおいしい学校給食をより安定的、効率的に提供することをめざす。

1.2. 施設概要

施設の概要は以下のとおりである。

事業用地	枚方市大峰元町2丁目2番10号	施設延べ面積	約 2,800 m ²
敷地面積	約 4,110 m ²	見学施設	有
提供食数	一日当たり最大 6,000 食	献立方式	完全1献立
アレルギー対応食数	120 食(想定)	米飯施設	なし
供用開始	令和10年1月	維持管理・運営期間	15年7か月
対象校	第一学校給食共同調理場改修中(選択制給食): 中学校 19校 第一学校給食共同調理場改修後(全員制給食): 中学校 9校		

◆事業用地

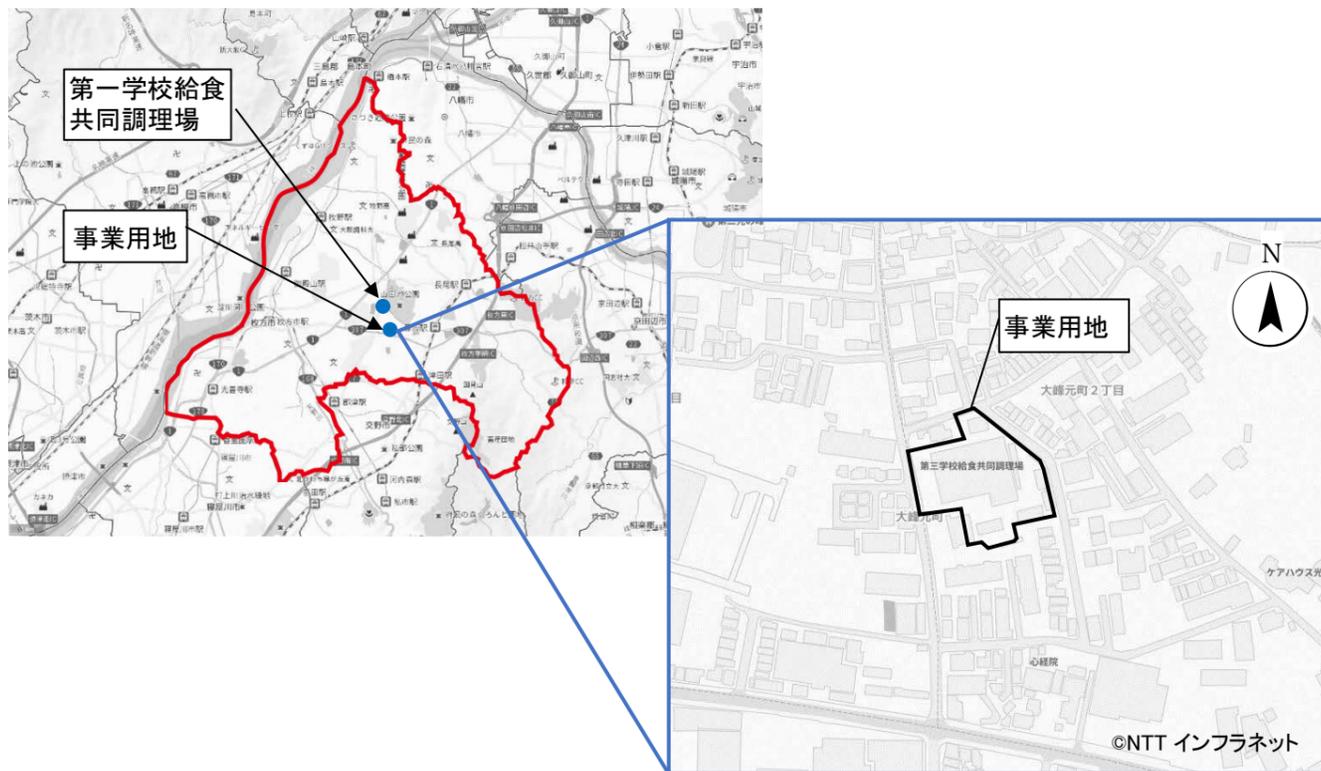


2. 本事業で適用する事業手法

PFI方式は、施設の整備、運営・維持管理を一括して民間事業者を実施させる方式であり、本事業においては、施設整備費の割賦払いが可能で、財政負担の平準化を図ることができるPFI(BTO)方式を採用する。

PFI方式では、事業に関係する様々な業態の民間事業者が出資し設立する特別目的会社(会社法に基づく株式会社。以下「SPC」という。)が地方公共団体との契約を締結し、施設の整備、運営・維持管理を実施する。

施設整備資金はSPCが自ら金融機関からの借入により調達するため、地方公共団体に加え、金融機関が借入人のSPCに対して経営状況の監視を行うことになり、地方公共団体と金融機関による二重の事業監視の仕組みを導入することになる。地方公共団体と金融機関は、SPCの経営状況に係る情報共有や、SPCの経営不振時への対応等を内容とする「直接協定(Direct Agreement)」を締結する。

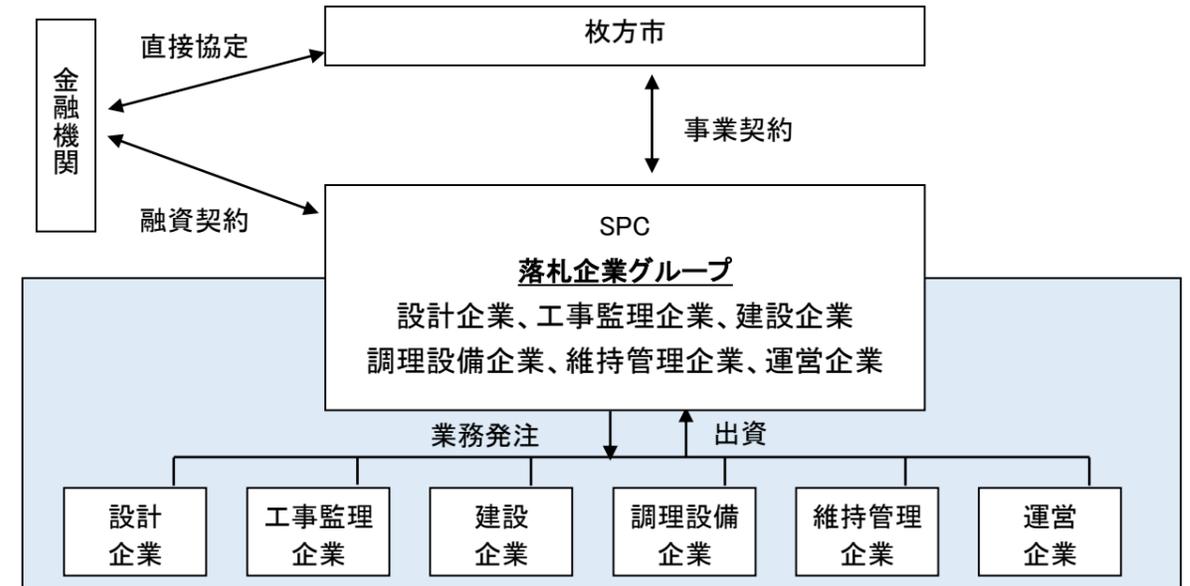

3. 事業者の募集及び選定方法

本事業では、設計、工事監理、建設、各種備品調達、開業準備、維持管理及び運営の各業務において、事業者の広範囲かつ高度な技術力や能力等による効率的かつ効果的なサービスの提供を求めることから、事業者の選定にあたっては、価格のみならず民間のノウハウ並びに創意工夫を総合的に評価することが必要である。したがって、事業者の選定方法は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に基づき、サービス対価の額や各業務における能力、事業の継続性、安定性等を総合的に評価する「総合評価一般競争入札方式」により行うものとする。

事業スケジュール(案)

参考資料2

年度		R5年度				R6年度(2024年度)				R7年度(2025年度)				R8年度(2026年度)				R9年度(2027年度)				R10年度(2028年度)				R11年度(2029年度)																																															
四半期		第4				第1				第2				第3				第4				第1				第2				第3				第4																																							
月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4																				
■事業スケジュール																																																																									
共通						方針				公告				提案				選定				契約																																																			
	事業者募集選定手続き	着手				▼				▼				▼				▼																																																							
(過年度)	第3共調																																																																								
	基本設計																																																																								
	実施設計(確認申請含む)																																																																								
	解体工事																																																																								
	建築工事																																																																								
	開業準備																																																																								
	維持管理・運営																																																																								
	第1共調																																																																								
	改修設計																																																																								
	改修工事																																																																								
開業準備																																																																									
配膳室																																																																									
改修設計																																																																									
改修工事																																																																									
開業準備																																																																									
全員給食開始																																																																									



■全員給食開始を見据えたスケジュール

案	第3共調																																																
	基本設計																																																
	実施設計(申請含む)																																																
	確認申請																																																
	解体工事																																																
	建築工事																																																
	開業準備																																																
	維持管理・運営																																																
	第1共調																																																
	改修設計																																																
改修工事																																																	
開業準備																																																	
配膳室																																																	
改修設計																																																	
改修工事																																																	
開業準備																																																	
全員給食開始																																																	
